

# Vestre Fjordpark



# Baggrund



# Friluftsbadet



Aalborg  
Kommune

# Det gamle friluftsbad



# Baggrund

I 2009 lavede AK Bygninger en rapport over tilstanden af friluftsbadet, som viste at der var akut behov for en renovering

Kaj (livredder gennem en menneskealder) har længe snakket om at anlægget trængte til en meget kærlig hånd

Vinterbaderklubben har år tilbage rettet henvendelse til Kultur og Fritid, da de var vokset ud at deres utidssvarende lokaler. De er rundet 1000 medlemmer og havde ca. 30 m<sup>2</sup> klublokale.

Omdannelsen af området har i en årrække afventet afklaring af linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse. I kommuneplanen har en del af området været reserveret til 'Lindholmlinjen' som én af tre mulige linjeføringer. I en transportpolitisk aftale fra februar 2012 blev Lindholmlinjen fravalgt, hvorfor en længe ønsket og tiltrængt fornyelse af området nu ønskes igangsat.

**April 2014**

Projektet sendes i EU-udbud

**19. juni 2014**

Det Obelske Familiefond støtter med 9,5 mio

**7. aug 2014**

Gå-tur i Vestre Fjordpark



**21. aug 2014**

Workshop  
"Som om – Det levede liv"



**23. sep 2014**

Workshop  
"Åben tegnestue"

**15. dec 2014**

Lokale og Anlægsfonden støtter med 9,5 mio

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2014

**3. juli 2014**

Indgåelse af rådgiveraftale med Orbicon

**28. okt 2014**

Dispositionsforslag



**19. jan 2015**  
Projektforslag

**23. feb 2015**  
Forprojekt

**17. jun 2015**  
Hovedprojekt

**17. aug 2015**

1. licitation

**14. dec 2015**

LOA støtter med 2 mio

**28. aug 2015**

Standstning af samarbejde  
med Orbicon

**9. sep 2015**

Indgåelse af aftale  
med Niras

**16. okt 2015**

Udseendelse af  
rev. udbud

**20. nov 2015**

2. licitation

Projekt-  
forslag

Forprojekt

Hovedprojekt

Omprojek-  
tering

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2015

**6. jan 2015**

Nordea-fonden støtter  
med 9,5 mio



**14. maj 2015**

Det nuværende Friluftsbad  
åbner for sidste sæson

**12. okt 2015**

Udbud byggeledelse

**16. nov 2015**

Licitation  
byggeledelse

**23. aug 2015**

Det gamle Friluftsbad lukker  
og slukker...



## Feb. 2016

? støtter med 2 mio

### 1. feb 2016

Byggestart  
Nedrivning af bygninger



Byggeperiode

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2016

### Dec 2015 / Jan 2016

Opstart af byggeplads



### 1. maj 2016

Omdannelse af bådopbevaring



### 1. okt 2016

Afl levering af del af bådopbevaring



**9. juni 2017**

Aflevering eksterne  
Entreprenører

Klargøring til landstævne

Beplantning efter landsstævne  
EBL

Byggeperiode

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2017

**9. juni 2017**


Indvielse af Vestre Fjordpark

**29. Juni – 2. juli 2017**

DGIs landstævne



# Aktivitetsplan

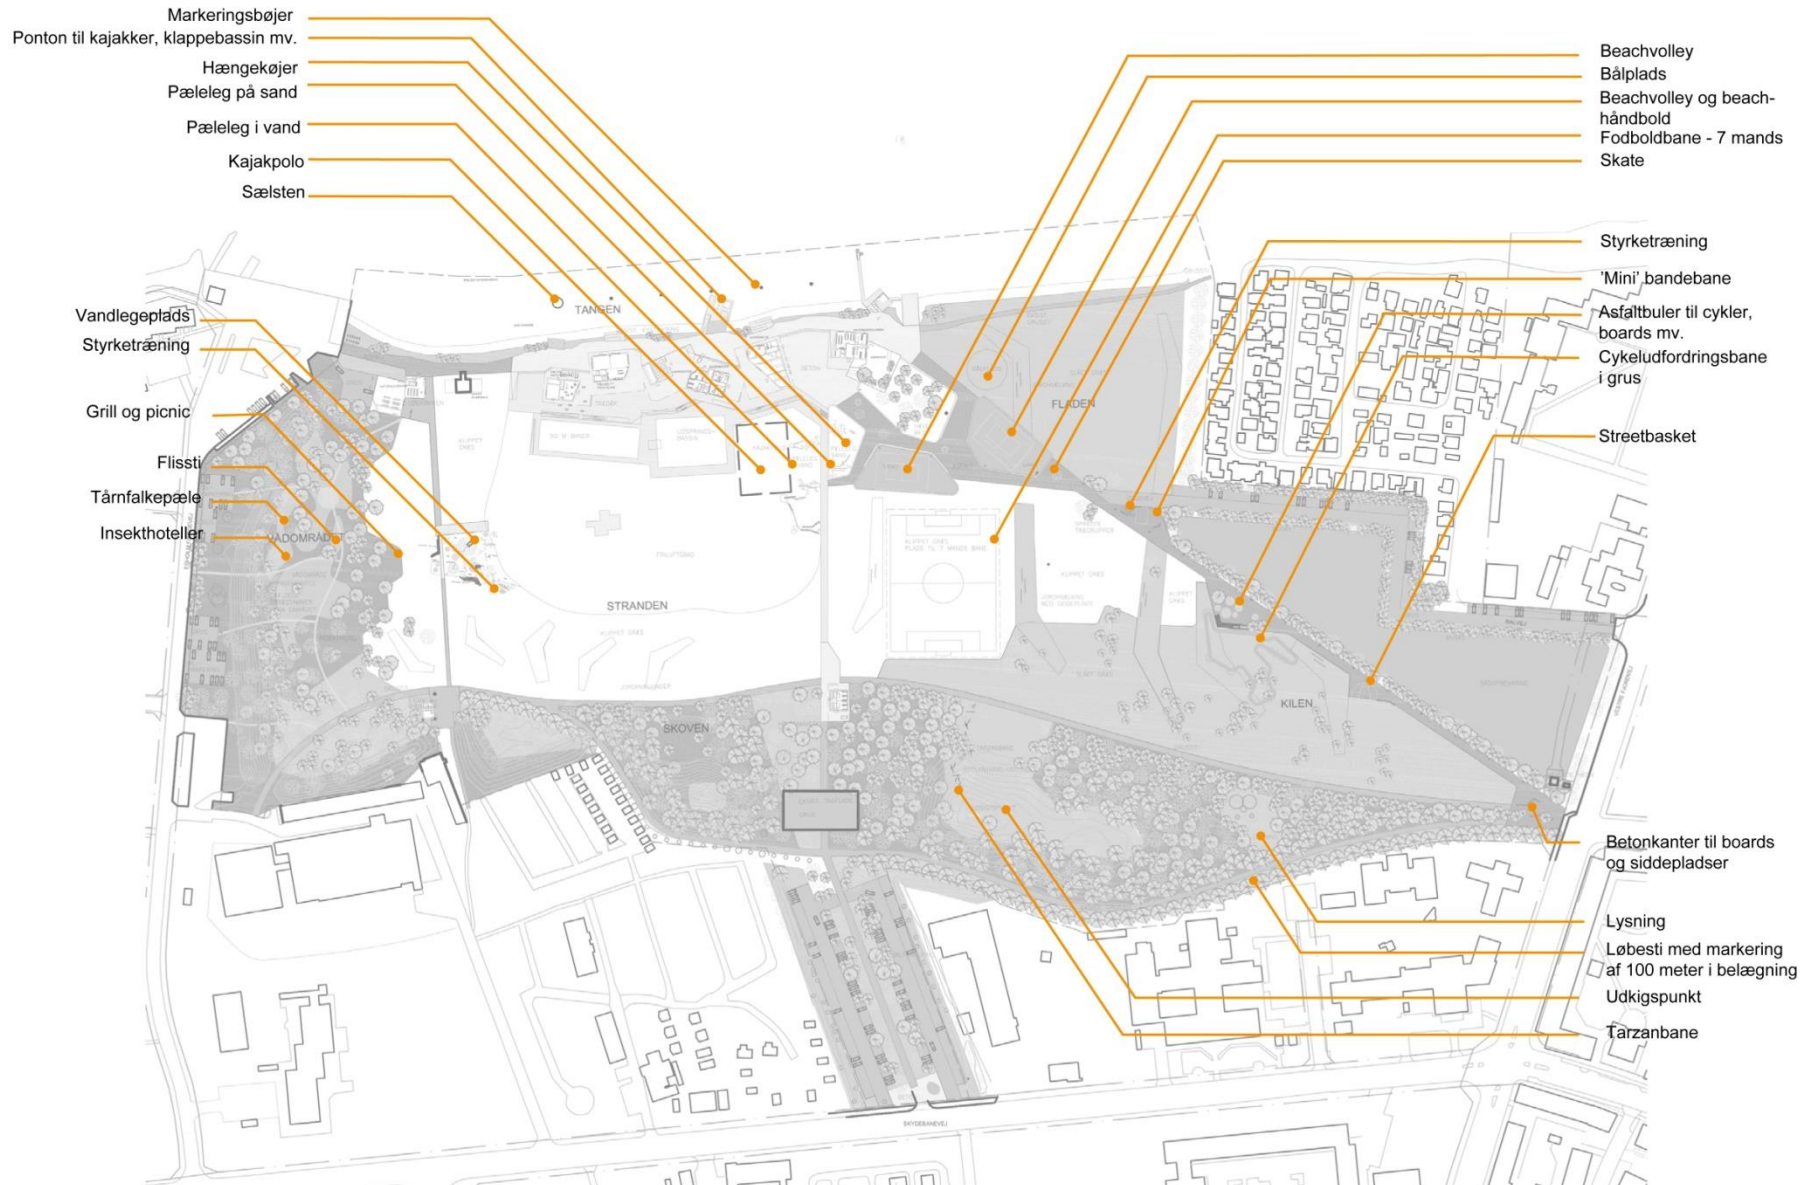

# Helhedsplan



# Vinterbadernes sauna



# Faste brugere

Vinterbaderne

Dykker Klubben

Aalborg Friluftsliv

Pirken

Snøren

AALBORG Beachvolley

Aalborg Havkajak Klub

Aalborg Fjordhaver

Ung Aalborg

Natur vejlederne



# Vestre Fjordpark



**Aalborg  
Kommune**

# Økonomi

- Det samlede budget for projekt er på 72,8 mio. kr
- Byrådet har afsat 39,9 mio
- Det Obelske Familiefond støtter med 9,488 mio (11,5 mio – moms)
- Nordea Fonden støtter med 9,488 mio (11,5 mio – moms)
- Lokale og anlægsskuffonden støtter med 11,5 mio
